

REUNIÃO DE ALINHAMENTO | 31 DE AGOSTO DE 2026

Tudo o que já construímos.

BooPay: evolução do produto, entregas verificáveis e decisões para a conversa de hoje com Rogério.

Onde estamos

Já existe uma base local funcional de integração WooCommerce, com API de revisão, catálogo e eventos. O produto completo de comércio conversacional permanece em construção.

O avanço em três frentes

- **Produto e planejamento:** escopo, arquitetura, roadmap, critérios de aceite, pesquisa de checkout e tese GEO + catálogo + compra + receita.
- **Implementação:** plugin WooCommerce 0.2.0, API local 0.2.0 e landing page com o personagem Boo e interações.
- **Preparação de lançamento:** identidade visual, apresentações, documentação, pacote instalável e kit de submissão ao Woo Marketplace.

O que precisamos destravar hoje

Confirmar a primeira demonstração aceita, acesso à tecnologia GEO e à loja piloto, integração com o backend de referência, ambiente público de testes e responsáveis por produto, marca e operação.

Mensagem central para abrir a reunião

“Avançamos da definição para uma base WooCommerce demonstrável. Agora precisamos ligar essa base ao GEO, à conversa de compra e ao pedido, com um critério de aceite único e dependências sob responsabilidade definida.”

Como ler os estados: “documentado” não significa implementado; “validado localmente” não significa homologado; “pendente” indica ausência de evidência suficiente no material consultado.

Como o projeto evoluiu

As decisões de 24, 25 e 26 de agosto alteram a leitura do desafio original.

Marco	O que fizemos	Efeito para o alinhamento
18-22/08	Análise do desafio, integrações, riscos de acesso e recorte do MVP. Documentação e primeiras rotas de identidade.	Horizonte amplo, com validação controlada e separação entre sandbox e produção.
22-23/08	Escopo, arquitetura, roadmap, backlog e dicionário organizados; primeira publicação de documentação no GitHub.	Base comum para produto, tecnologia e comunicação.
24/08	Primeira reunião com Rogério e mentor. WhatsApp retirado do produto.	Não integra o MVP nem foi transferido para o backlog.
25/08	PRD v1.0 recebido e analisado; checkout conversacional invisível definido como diferencial.	PRD passa a ser fundação funcional, não o limite do MVP de dezembro.
26/08	Tese incorpora GEO da KeyCore, prontidão do catálogo, checkout e atribuição de receita. Pesquisa, PDF e novas identidades.	Unir descoberta e resultado, sem prometer recomendação ou venda garantida.
28-29/08	Plugin 0.2.0, API de revisão, testes locais e kit Marketplace; conceito e implementação da landing com Boo.	Há software e material de lançamento, ainda sem evidência de operação pública completa.
31/08	Inventário consolidado; teste da API, validador do plugin, verificações estáticas da landing e hash do ZIP repetidos.	Este PDF distingue evidências atuais de resultados registrados anteriormente.

Atenção aos documentos históricos

O TXT original, a visão inicial e partes do briefing antigo ainda mencionam recuperação por WhatsApp. A decisão de retirada, registrada nos documentos vigentes, prevalece. Não reintroduzir essa frente por cópia de materiais antigos.

Uma jornada, quatro capacidades

Tese vigente: ser encontrado, ser escolhido, ser comprado e medir a receita.

Capacidade	Responsabilidade definida
1. GEO da KeyCore	Diagnosticar prontidão das páginas, guardar achados e evidências e relacioná-los aos produtos.
2. Catálogo agêntico	Normalizar produto, preço, estoque, políticas e elegibilidade dos canais.
3. Checkout conversacional	Conduzir revisão, confirmação, pagamento e pedido sem redirecionar o comprador ao site da loja.
4. Atribuição de receita	Correlacionar página, SKU, recomendação, sessão, pedido e estorno com origem identificada.

Arquitetura que já foi definida

WooCommerce / Shopify / VTEX alimentam contratos comuns de catálogo e eventos. O núcleo do Boopay orquestra os dados e a sessão de compra; adaptadores ACP/UCP e um simulador usam esse mesmo núcleo. GEO participa da preparação do catálogo, fora do caminho síncrono do pagamento.

Camada	Papel planejado	Evidência atual
PostgreSQL	Dados transacionais, integrações e pedidos.	Arquitetura documentada.
Firestore	Estado recente, sessões e projeções operacionais.	Integração não comprovada nesta base.
BigQuery	Histórico, funil e análises de receita.	Integração não comprovada nesta base.
Provedores de IA	GPT e Gemini por interface comum; Groq/Qwen propostos para desenvolvimento.	Estratégia descrita; avaliações integradas pendentes.

Recorte preservado

WooCommerce é a primeira loja demonstrativa. Shopify e VTEX continuam no horizonte documentado do MVP. Multilojas, planos, CDP completo e rastreamento avançado ficam para depois. WhatsApp está excluído do produto.

O lojista continua responsável pela venda, e o e-commerce é a fonte do preço, estoque e pedido. Revisão e confirmação explícitas do comprador são obrigatórias.

Decisões transformadas em contratos

A documentação cobre produto, implementação esperada, qualidade e evolução.

Conjunto entregue	O que ficou registrado
Índice, visão e README	Posicionamento, estado do projeto, limites, fontes e organização entre GitHub e Notion.
Escopo + arquitetura	Três plataformas, dados, provedores, contratos canônicos e jornada completa para uma loja.
Roadmap + aceite + backlog	Marcos até dezembro, critérios por capacidade, falhas, segurança e itens fora do MVP.
Dicionário técnico	Vocabulário para produto, agentes, dados, pagamentos e integrações.
Briefing + checkout + GEO	Perguntas para Rogério, decisões centrais, análise de mercado e integração com a KeyCore.
Materiais de apresentação	PDF de apoio à reunião anterior, pitch deck de 14 páginas, PDF da tese GEO e apresentação de cinco identidades.

O que a leitura do PRD revelou

O PRD descreve autenticação e gestão de lojistas, WooCommerce, catálogo assinado, busca JSON-RPC, impressão/clique e painel. Nele, checkout e Stripe são apenas demonstrações sem movimentação financeira.


Lacuna registrada no PRD	Avanço comprovável nesta pasta
Licença sem endpoint e divergências de campos/token/HMAC.	Contrato v1 unificado e API local com troca de código, token com expiração e assinatura.
Sincronização e diagnóstico incompletos.	Plugin com carga inicial, incrementos, exclusão, variações, fila, retentativas e teste de conexão.
Autorização, CORS, Dockerfile e integração do backend NestJS.	Não há comprovação de correção no backend original. A API local não o substitui como entrega de produção.
Busca JSON-RPC, pixel/clique, painel e idiomas.	Cobertura integral desses requisitos ainda não demonstrada pelo gateway local.

Ponto para Rogério: alinhar qual repositório/backend será a base oficial e quem integrará o contrato do plugin a ele.

Plugin WooCommerce 0.2.0

Pacote instalável e candidato à revisão, com escopo claramente delimitado.

- **Conexão nativa:** configurações dentro do WooCommerce, código temporário trocado por credencial e segredo de assinatura.
- **Catálogo:** carga inicial paginada, atualizações de produtos e variações, preço, estoque e exclusão.
- **Operação:** fila em segundo plano, até cinco tentativas, diagnóstico de conexão, logs sanitizados e limpeza na desinstalação.
- **Eventos:** view, add_to_cart e exit_intent opcionais, com identificadores pseudonimizados e integração com consentimento compatível.

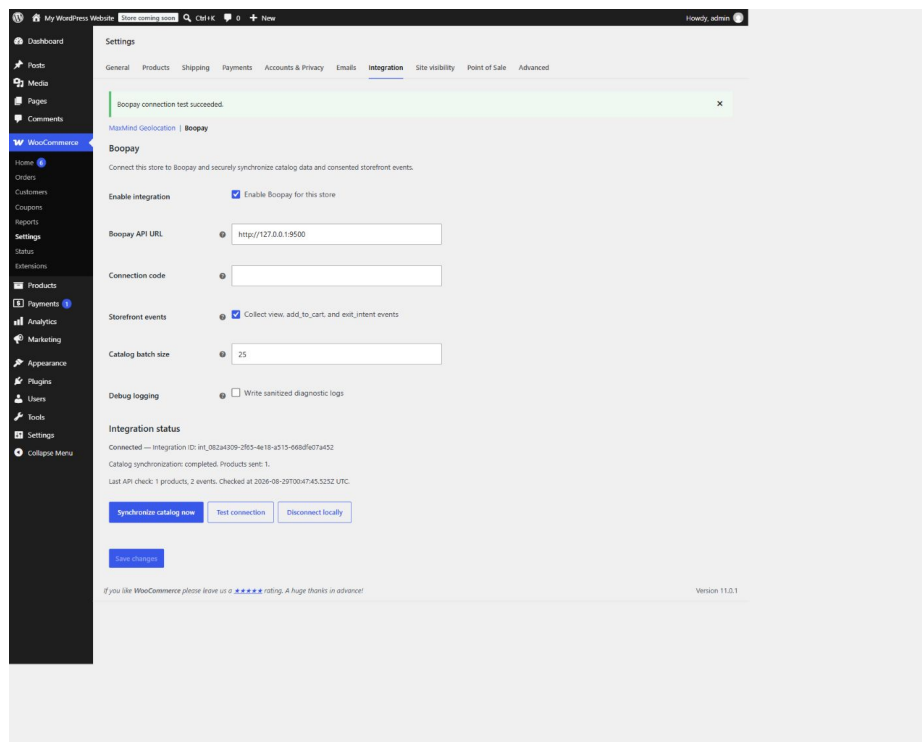

Tela real da instalação de revisão: conexão bem-sucedida, catálogo sincronizado e tracking habilitado nessa loja de teste. As credenciais não aparecem na captura.

O que o ZIP entrega - e o que não entrega

O pacote contém o conector WooCommerce. Não implementa checkout invisível, processamento de pagamentos, Shopify/VTEX ou assinatura comercial do Marketplace. O tracking permanece desligado por padrão em novas instalações; foi ativado na loja demonstrativa.


Artefato: output/wordpress/boopay-woocommerce-0.2.0.zip

Identidade do pacote: 31.804 bytes, 23 entradas; hash completo na página 7.

API local e prova de integração

Um ambiente de revisão foi construído para exercitar o plugin antes do SaaS público.

Endpoint implementado	Função
/v1/auth/validate-license	Troca código de uso único por credenciais da integração.
/v1/catalog/ingest	Recebe catálogo assinado e atualiza o registro local.
/v1/events/ingest	Recebe os eventos de vitrine do conector.
/v1/integrations/woocommerce/status	Valida a conexão e informa o estado observado.

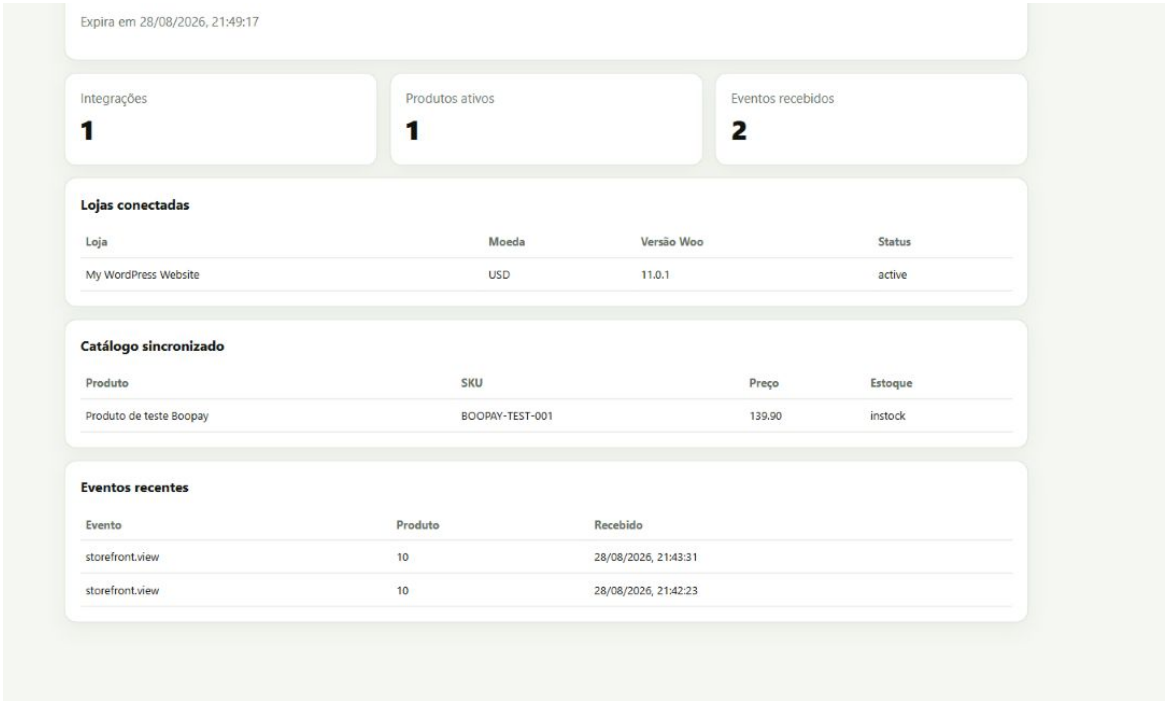

Painel do gateway de revisão: uma integração, um produto e dois eventos no registro de 28/08. Esses números são dados de teste, não clientes, tráfego ou resultados comerciais.

O que foi exercitado hoje

A suíte existente passou em 31/08: conexão, rejeição de reutilização do código, ingestão HMAC, catálogo, evento, saúde e repetição idempotente. Também rejeitou assinatura inválida e timestamp antigo. É um cenário integrado com várias verificações, não uma auditoria completa.

Limite de uso

Gateway Node.js 0.2.0, restrito ao computador local e com estado em arquivo JSON. Não é o backend NestJS/PostgreSQL do PRD, nem um ambiente de produção. O painel de revisão também não equivale ao dashboard completo do produto.

O que foi verificado

Resultados de hoje separados dos testes preservados no relatório de 28 de agosto.

Verificação	Data / resultado	Alcance e limite
Validador do plugin	31/08: passou	16 arquivos PHP; estrutura, contrato e verificações do pacote-fonte.
Teste integrado da API	31/08: 1 teste passou	Conexão, HMAC, catálogo, eventos, saúde, idempotência e casos negativos presentes na suíte.
TypeScript da landing	31/08: passou	Verificação estática sem emissão de arquivos. Não comprova UX em todos os dispositivos.
Lint da landing	31/08: passou	Análise estática. Build e teste visual completo da página não foram repetidos hoje.
ZIP candidato	31/08: hash conferido	Mesmo SHA-256 registrado no relatório do pacote final.
Plugin Check 2.1.0	28/08: aprovação local registrada	Ambiente Playground; duas adaptações de filesystem no verificador, sem desativar regras.
Compatibilidade WordPress/Woo/PHP	28/08: aprovação local registrada	WP 7.0 / Woo 11.0.1 / PHP 8.3 e WP 6.9 / Woo 10.9.4 / PHP 7.4.
Navegador: fluxo crítico	28/08: aprovação local registrada	Conexão, sincronização de um produto, evento consentido e teste de saúde.
QIT gerenciado e homologação	Sem evidência de conclusão	Configuração QIT existe, mas a revisão oficial e os testes gerenciados continuam externos.

Rastreabilidade do pacote final

boopay-woocommerce-0.2.0.zip
SHA-256
C2130DF155FD25AAB0B4750B73254932DCD65C451BCCE8A4E403CCEC366EA74E

Não confundir níveis de validação

Teste local e análise estática sustentam a demonstração técnica. Não certificam segurança, privacidade, escala, conformidade jurídica, aprovação do Marketplace ou operação de pagamentos.

GEO: análise feita, integração pendente

A ferramenta da KeyCore foi avaliada e seu papel no produto já está documentado.

Registro histórico da avaliação prática

Em 26/08, a documentação registra auditoria de keycore.com.br, /solucoes e /quem-somos, com score 89/100. Esse resultado pertence àquela execução; não mede o Boopay e não foi revalidado neste levantamento.

O aprendizado já incorporado

- GEO mede prontidão técnica e editorial. Produto elegível, recomendação observada e pedido atribuído são etapas diferentes.
- A auditoria deve gerar score, achados e evidências versionados e persistidos, ligados à URL e ao SKU canônico.
- O serviço GEO não pode interromper o pagamento ou alterar preço, estoque, entrega e pedido.
- No MVP, o uso da auditoria é de leitura. Correções automáticas do site e experimentos de causalidade ficam fora.

Problemas registrados na avaliação

O histórico indicava conclusão dos especialistas, mas o resumo mostrava “0/4 especialistas”. A tela exibia score final e opção de PDF enquanto a área de achados dizia não haver relatório. Antes de integrar, é preciso um estado final único e persistente.

Contrato de integração já proposto	O que falta combinar
Entrada: loja, URLs autorizadas, idioma, região e identificador de correlação.	Como o Boopay recebe acesso: API, webhook ou importação inicial?
Saída: identificador da auditoria, estado, score, achados, evidências, versão, custo e duração.	Quem responde por autenticação, persistência, disponibilidade e correções?
Falhas: estado parcial/erro, retentativa, limites, isolamento por loja e proteção de URLs.	Qual loja e quais três páginas serão a primeira prova de integração?

Limite comercial: não prometer que elevar o score garante citação, recomendação, posição ou aumento de vendas. O funil deverá separar evidências simuladas e oficiais.

Do catálogo até o pedido

A arquitetura do checkout está definida; a compra completa ainda precisa de evidência executável.

Fluxo de aceite que já foi desenhado

Etapa	Condição para considerar concluída
Preparar	Auditar a loja, relacionar URL ao SKU e consultar catálogo válido e atualizado.
Recomendar	Agente usa somente dados do catálogo e regras comerciais autorizadas; origem da recomendação identificada.
Revisar	Sessão consulta preço, estoque, entrega, tributos e descontos no e-commerce e apresenta o total ao comprador.
Confirmar	Comprador confirma explicitamente o resumo. Mudanças relevantes exigem nova revisão.
Concluir	Pagamento em sandbox, resposta a falhas e exatamente um pedido no e-commerce, mesmo com chamadas repetidas.
Medir	Dashboard liga auditoria, produto, recomendação, sessão, pedido e eventual estorno.

Frentes planejadas, ainda sem prova completa

- **IA:** camada comum de provedores, catálogo contextual, regras, embeddings e avaliação com GPT/Gemini. Groq/Qwen aparece como proposta de testes, não validação dos modelos finais.
- **Protocolos e pagamentos:** adaptadores ACP/UCP, Checkout Core, tokenização, Stripe Connect/Google Pay em sandbox, webhooks e reconciliação.
- **Dados e produto:** persistência nos bancos previstos, perfil 360°, dashboard de receita, busca autorizada para agentes e demais requisitos do PRD.

Cuidados na demonstração

O botão de confirmação da landing altera a interface local; não comprova pedido ou pagamento no backend. A demonstração comercial não deve ser apresentada como transação real. O sandbox próprio e uma superfície oficial de IA exigem evidências distintas.

Boo ganhou um sistema visual

Exploração de marca, materiais de apresentação e landing page implementada localmente.

Entrega	Conteúdo disponível
Identidade inicial	3 rotas: Pulso, Amigo e Agente. 21 SVGs: logo, Boo, ícone, paleta, padrão, peça social e prévia de dashboard por rota.
Exploração adicional	10 pranchas conceituais e 5 propostas: Tag, Recibo, Tap, Pedido e Confirmação; apresentação PPTX com cinco versões.
Conceito da landing	Pesquisa de referências, direção visual, roteiro de implementação, prompts, briefing e 4 storyboards.
Landing implementada	Next.js/TypeScript, animações de scroll, Boo em WebGL com alternativa em imagens, navegação e confirmação ilustrativa.



Prancha do Boo usada como referência artística para a landing. É um asset já produzido, não uma nova escolha de identidade nesta reunião.

Implementação que existe na pasta

Modelo editável no Blender e exportação GLB; 14 frames de saída e 12 de repouso; fallback para falhas de WebGL e preferência por movimento reduzido. A direção atual usa creme, petróleo, menta e laranja, sem roxo.


Pendências para a página pública

Definir domínio e canal de contato, aprovar o uso da marca, executar a revisão final em dispositivos e publicar. O README ainda descreve parte de uma versão anterior da animação; código e DESIGN.md mostram a evolução para WebGL. A landing não é um dashboard operacional.

Kit do Woo Marketplace

Código, textos e imagens foram preparados; submissão e aprovação não foram comprovadas.

Material produzido	Uso
ZIP 0.2.0 + changelog	Candidato instalável, estrutura validada e sem arquivos de desenvolvimento no pacote registrado.
Listagem + formulário	Descrição do produto, recursos, FAQs, metadados e campos de submissão; há decisões comerciais a preencher.
Documentação + privacidade	Instruções de uso e inventário de dados. Textos legais ainda exigem decisão do operador e revisão apropriada.
Suporte + manutenção + revisão	Plano operacional, instruções ao revisor, relatório técnico e checklist de prontidão.
Assets de galeria e ícones	5 imagens 1792 x 1100; 3 opções de ícone 160 x 160 em PNG/SVG; manifesto, ordem e textos alternativos.



Uma das cinco imagens de galeria preparadas. A rota Amigo é candidata/recomendação registrada, não homologação de identidade ou aprovação da Woo.

Etapas externas que permanecem abertas

Definir o vendedor e a representação do serviço; decidir monetização, preço e suporte; preparar domínio, documentos públicos e staging HTTPS. Depois, concluir conta vendedor, submissão, QIT gerenciado e revisões comercial, técnica e de experiência.

A documentação oficial exige conta vendedor aprovada antes da submissão e prevê testes QIT e revisão do produto. Para SaaS, o modelo comercial pode demandar Billing API ou acordo específico. **Processo de submissão** e **monetização**.

O que podemos afirmar hoje

Classificação baseada no material acessível. Ausência de evidência aqui não prova ausência de trabalho em outros repositórios.

Frente	Estado	Próxima evidência necessária
Escopo e arquitetura	Documentados	Alinhamento formal das prioridades e critérios.
Pesquisa GEO/checkout/mercado	Registrada	Revalidar disponibilidade e regras antes de compromissos.
Plugin WooCommerce	Implementado; validado localmente	Demonstração integrada ao backend oficial/staging.
API de revisão	Implementada; teste repetido	Migração/integração com backend persistente de produção.
Catálogo e eventos Woo	Fluxo local demonstrado	Volume, falhas, cobertura e reconciliação ampliados.
Busca JSON-RPC / pixel / clique	Requisitos do PRD	Implementação e teste no backend de referência.
Shopify e VTEX	Planejados	Adaptadores e jornadas reais de teste.
GEO dentro do Boopay	Contrato proposto	Resultado persistido, URL ligada ao SKU e tela integrada.
IA / perfil 360° / embeddings	Planejados	Provedores e dados funcionando no mesmo fluxo.
ACP/UCP / Checkout Core	Arquitetura definida	Contratos, máquina de estados e teste reproduzível.
Pagamentos e pedidos	Sandbox planejado	Transação de teste, pedido único e tratamento de estorno.
Dashboard completo	Planejado	Funil e métricas reconciliados; painel local não basta.
Identidade e landing	Assets e código locais	Aprovação final, revisão visual e publicação.
Woo Marketplace	Kit candidato preparado	Conta, operação, submissão e aprovação externa.
WhatsApp	Retirado do produto	Nenhuma implementação prevista.

Defasagem de compartilhamento encontrada

A raiz da branch main consultada no GitHub contém documentação e o PDF antigo, mas não contém o plugin, a API, a landing, o kit Marketplace nem os documentos 07/08. Publicar e versionar esses avanços é uma ação pendente; nada foi enviado ao repositório neste levantamento.

O que pode bloquear o próximo salto

As lacunas agora atravessam integração, infraestrutura e decisões do dono do produto.

Prior.	Decisão / risco	Saída esperada na reunião
P0	Base técnica oficial: PRD menciona NestJS; o gateway entregue é local.	Indicar repositório autoritativo, responsável e estratégia de integrar o contrato v1.
P0	GEO ainda não integrado e estado final inconsistente na avaliação anterior.	Responsável KeyCore, forma de acesso, exemplo de resultado e prazo de correção/contrato.
P0	Sem staging público e critérios fechados da primeira prova.	Domínio/infra, acesso à loja, orçamento de testes e demonstração mínima acordada.
P1	Checkout, pedidos e dados ainda não formam uma jornada.	Ordenar a construção: catálogo -> sessão -> confirmação -> pedido -> métrica.
P1	Materiais locais não refletem a main consultada.	Responsável por versionar código, documentos atuais e evidências de forma segura.
P1	Marketplace depende de vendedor, monetização e operação.	Definir empresa, representação, suporte, marca e prioridade real da submissão.

Modelo comercial: existe hipótese, não preço aprovado

O documento GEO propõe implantação/diagnóstico, mensalidade e participação sobre resultado atribuído; eventual margem financeira aparece como opcional. Não há preço, contrato, receita realizada ou validação comercial comprovados neste levantamento.

Para a Woo, decidir o modelo de integração com o serviço externo antes de assumir obrigações de cobrança. Detalhar moeda, periodicidade, teste gratuito, cancelamento, suporte e responsabilidades com revisão do operador.

Segurança antes de expor o serviço

Concluir revisão de autorização por recurso, segredos, vínculo da mensagem assinada, repetição de requisições, retenção e consentimento. Ampliar os testes negativos. O resultado local atual não deve ser usado como selo de segurança ou conformidade.

Da base local à prova de valor

Proposta de execução para validar com Rogério; não substitui o calendário oficial.

Período	Foco documentado	Prova de conclusão
Próximo ciclo	Consolidar fonte oficial, loja, staging e contrato GEO; integrar catálogo/eventos ao backend escolhido.	O mesmo produto e evento chegam ao backend persistente com evidência compartilhável.
Setembro	Coleta e dados; primeira integração GEO; sessão canônica e simulador; primeira visão de perfil e dashboard.	Navegação atualiza dados; auditoria liga URL a SKU; sessão consulta catálogo e total reais da loja de teste.
Outubro	Shopify/VTEX, provedores de IA, contratos ACP/UCP e prontidão de catálogo.	Adaptadores usam o mesmo núcleo e passam pelos testes de contrato.
Novembro	Pagamentos sandbox, pedidos, reconciliação, perfil completo e funil.	Compra e abandono são refletidos corretamente; repetição não duplica pedido nem métricas.
Dezembro	Estabilização, falhas, segurança, custos, documentação e demonstração final.	Jornada repetível e auditável, sem redirecionamento; oficial/sandbox/simulado separados.

Entrega Parcial: datas já registradas

18/09: meta interna para fechar conteúdo. **21/09:** meta interna para pacote pronto. **21 a 25/09:** janela descrita no README como Entrega Parcial. Estas datas não foram confirmadas com a instituição neste levantamento; reconfirmar canal e regras com a mentoria.

Pacote mínimo sugerido para o próximo checkpoint

- Código e documentação atuais no repositório oficial, sem credenciais.
- Demonstração repetível do WooCommerce conectado ao backend escolhido, acompanhada de relatório de teste.
- Primeiro resultado GEO persistido e relacionado a um produto, ou impedimento externo documentado com responsável.
- Critério de aceite escrito para a próxima etapa de checkout, com responsável e prazo.

Pauta e registro de decisões

Sugestão de 30 minutos. Usar este documento como apoio, reservando a maior parte da conversa para decisões.

Tempo	Assunto	Resultado desejado
0-4 min	Mudanças desde a última reunião	Confirmar WhatsApp fora e tese GEO + compra + receita.
4-10 min	Mostrar plugin e gateway; situar landing	Distinguir evidência funcional, visual e planejamento.
10-24 min	Resolver decisões prioritárias	Definir primeira prova, responsáveis e dependências.
24-30 min	Registrar acordos e próximo encontro	Uma ação, um responsável, um prazo e uma evidência por decisão.

Perguntas para fechar o alinhamento

- 1. Qual demonstração caracteriza avanço aceito na próxima entrega e qual loja será usada?
- 2. Qual backend/repositório é a referência oficial, e quem conecta a ele o plugin já entregue?
- 3. Como receberemos o resultado GEO da KeyCore, e quem garante seu estado final persistente?
- 4. Quem libera staging, domínio, contas de teste e orçamento para integrar a jornada?
- 5. Marketplace entra agora ou após o piloto? Quem responde por empresa, cobrança, suporte e marca?
- 6. Qual é o próximo checkpoint e quais evidências devem estar prontas até lá?

Tema	Decisão / próximo passo	Responsável	Prazo
Primeira prova	_____	_____	_____
Backend oficial	_____	_____	_____
GEO / acessos	_____	_____	_____
Staging / orçamento	_____	_____	_____
Marketplace / marca	_____	_____	_____
Checkpoint	_____	_____	_____

Fechamento sugerido: “Ficamos alinhados em entregar [evidência] até [data]. [Responsável] cuida de [dependência]. Vamos validar o resultado no próximo encontro em [data].”

Onde está cada evidência

Inventário do workspace consultado em 31/08/2026. Os códigos F1-F13 aparecem nos rodapés.

Fonte	Arquivos / evidências
F1 Produto	README.md; Boopay-00-INDICE.md; Boopay-01-ESCOPO-MVP.md; Boopay.md; Desafio Squad 45.txt.
F2 Arquitetura e plano	Boopay-02-ARQUITETURA-E-FLUXOS.md; Boopay-03-ROADMAP-E-ACEITE.md; Boopay-04-BACKLOG.md; Boopay-05-DICIONARIO-TECNICO.md.
F3 Novas decisões	Boopay-06-BRIEFING-REUNIAO-ROGERIO-2026-08-24.md; Boopay-07-CHECKOUT-CONVERSACIONAL.md; Boopay-08-GEO-E-CHECKOUT-INVISIVEL.md.
F4 PRD	PRD BooPay - v1.0.pdf, 8 páginas, recebido em 25/08/2026.
F5 Plugin	boopay-woocommerce/: README.md, docs/API-CONTRACT.md, código, qit.json e tools/validate-package.mjs; ZIP em output/wordpress/.
F6 API local	boopay-api-demo/: README.md, package.json, src/ e test/api.test.mjs.
F7 Validação	marketplace/VALIDATION-REPORT.md; MARKETPLACE-READINESS.md; capturas em marketplace/assets/; verificações repetidas em 31/08.
F8 Apresentações	Boopay-Apoio-Reuniao-Rogerio-2026-08-24.pdf; output/pdf/Boopay-Pitch-Deck-2026.pdf; output/pdf/Boopay-08-GEO-E-CHECKOUT-INVISIVEL.pdf; output/presentations/Boopay-identidade-5-versoes.pptx.
F9 Identidade	boopay-identidade/: 3 rotas SVG, 10 pranchas e 5 novas versões.
F10 Landing	boopay-landing-next/: README, PRODUCT, DESIGN, app/, modelo Blender, GLB e frames.
F11 Conceito	boopay-landing-conceito-2026-08-28/: pesquisa, direção, storyboard, prompts, briefing e assets.
F12 Kit Marketplace	marketplace/: README, PRODUCT-LISTING, SUBMISSION-FORM, PUBLIC-DOCUMENTATION, PRIVACY-DISCLOSURE, SUPPORT-AND-MAINTENANCE, REVIEWER-INSTRUCTIONS, ASSET-MANIFEST, EXTERNAL-PROCESS e DECISIONS-NEEDED.
F13 Verificação externa	GitHub: conteúdo da main; Woo: submissão; Woo: monetização. Consultados em 31/08/2026.

Limites do levantamento. Fontes locais atuais prevalecem sobre resumos históricos. Histórico anterior foi usado para localizar entregas e reconstruir a evolução; os arquivos principais foram relidos. O Notion não foi reconsultado, a avaliação GEO de 26/08 não foi repetida e não foram inspecionados outros repositórios ou contas privadas de produção. Não há alegação de conclusão fora das evidências indicadas.

Organização: [repositório Boopay](#) | [painel Notion indicado no README](#) (acesso sujeito a permissão).
